



Calendrier du chantier SBGE:


220434 : mise à une bande (adaptation trottoirs) – du 26/06 au 05/07

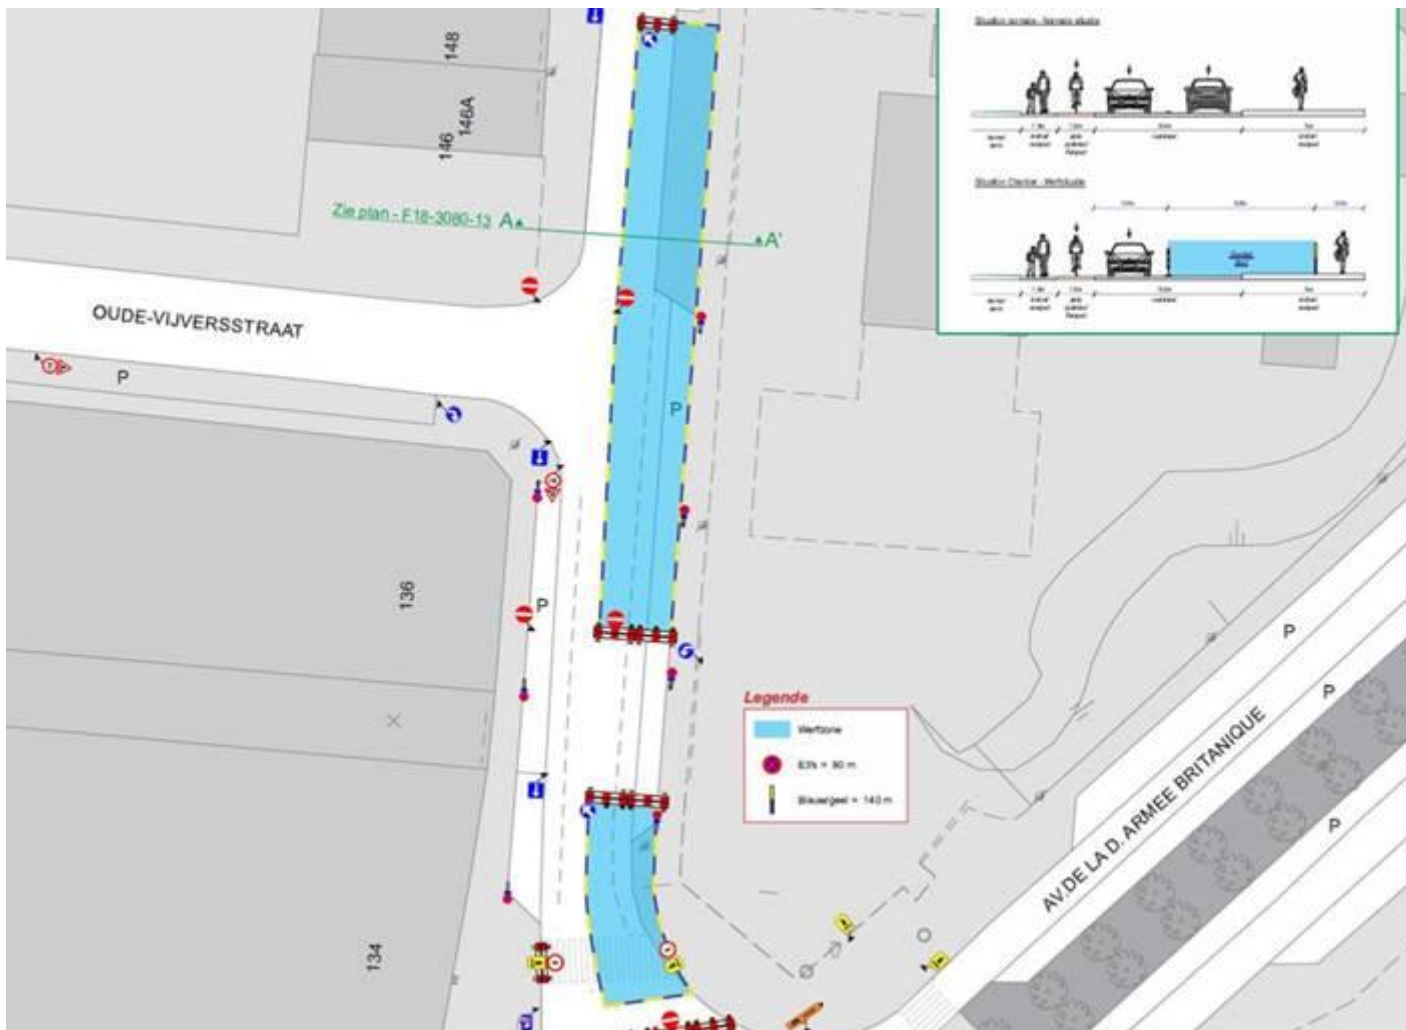


148903 - phase 13 : mise à une bande (création de chambres d'égout) – du 05/08 au 25/10

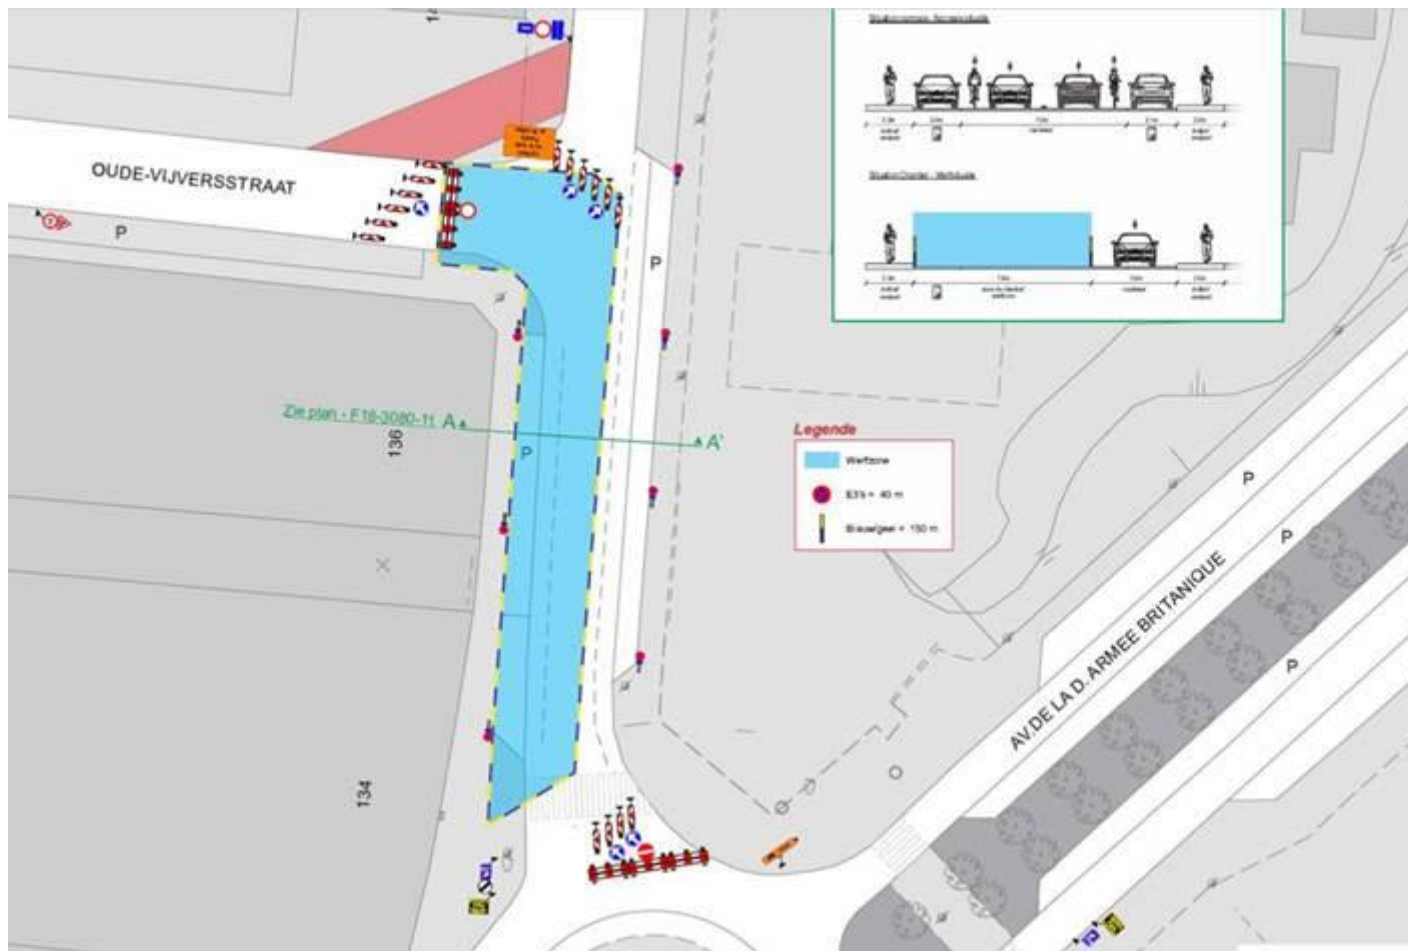


148903 - phases 14 et 15 : fermeture complète (pose tuyaux et fonçage) – du 28/10 au 29/11

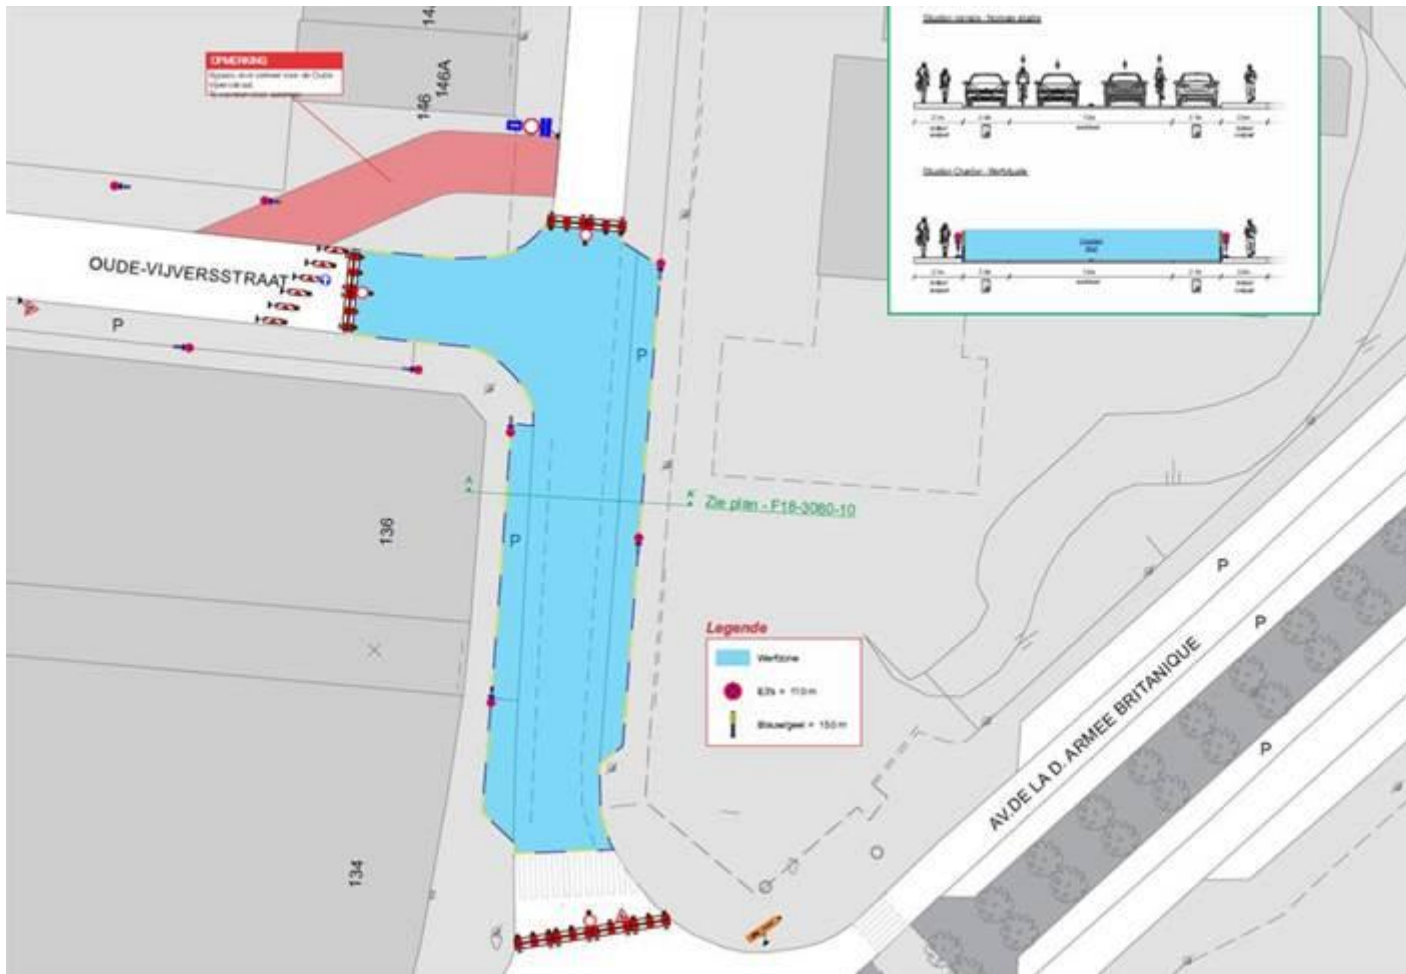

148903 - phase 16 : mise à une bande (réfections côté pair) – du 02/12 au 20/12

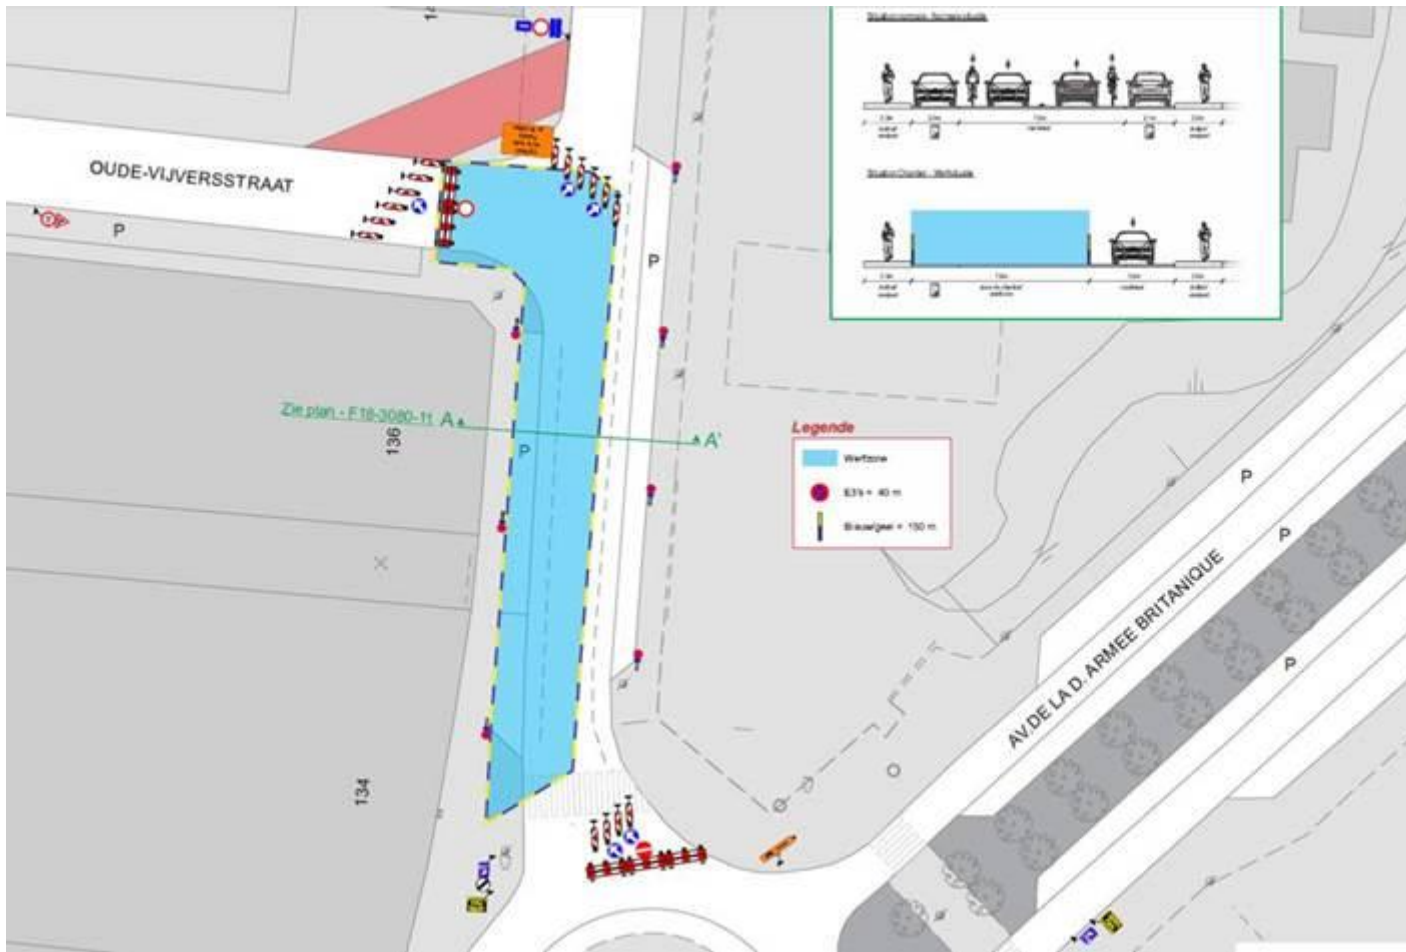

148903 - phase 17 : mise à une bande (réfections côté impair) – du 06/01 au 13/01

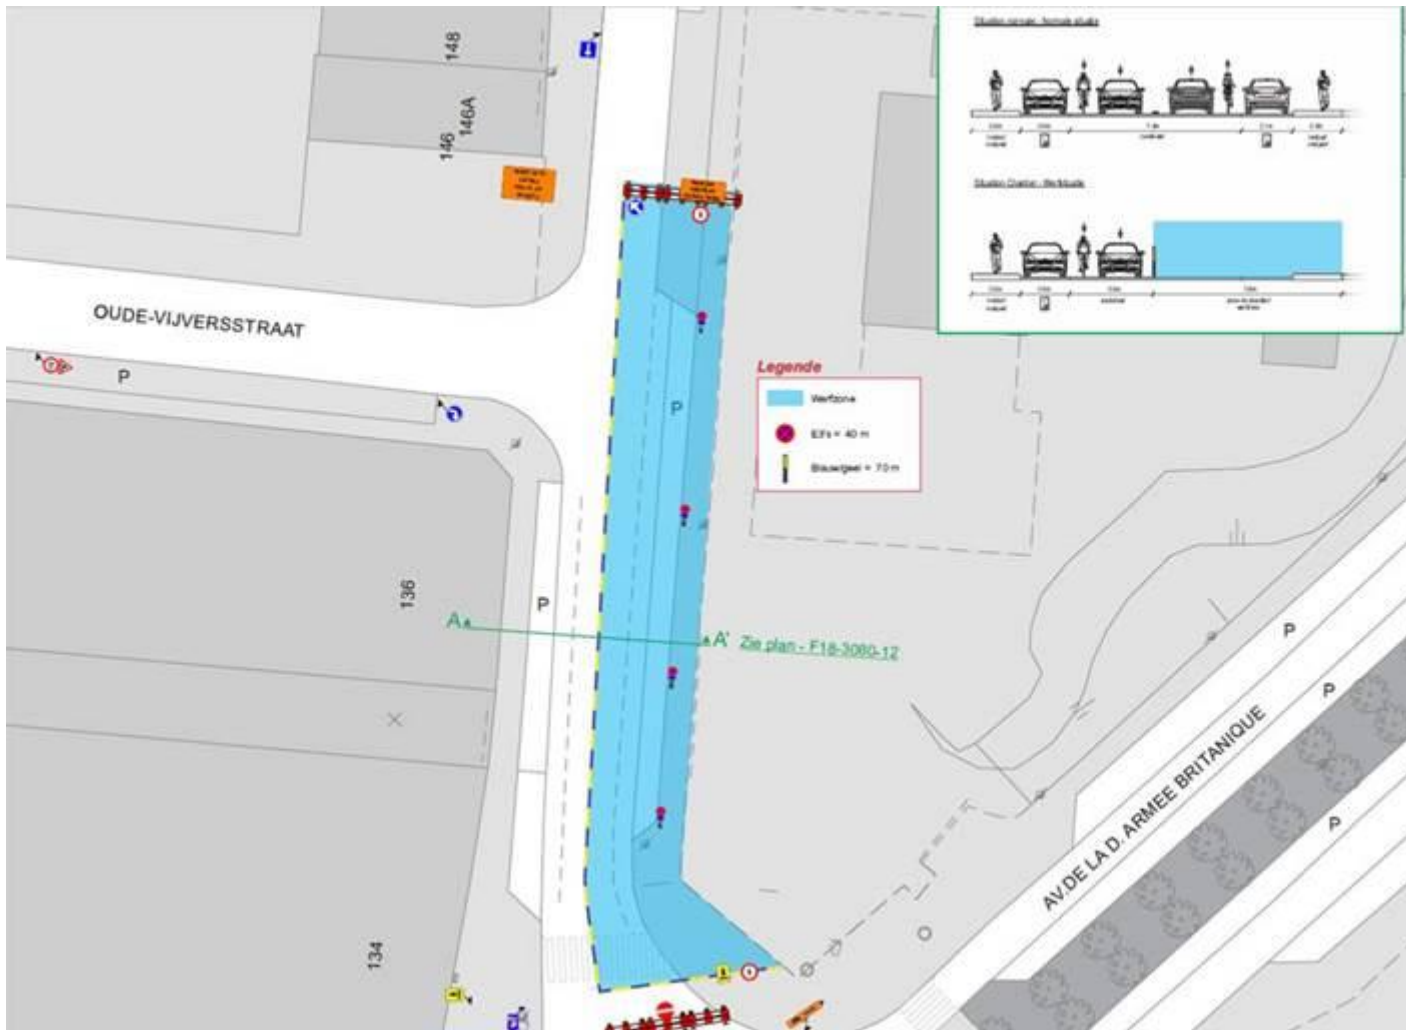

148903 - phase 18 : fermeture complète (réfections complète asphalte) – du 14/01 au 15/01

